Weislow - 630 Benicia Drive - Project Construction Schedule at 5-24-2013

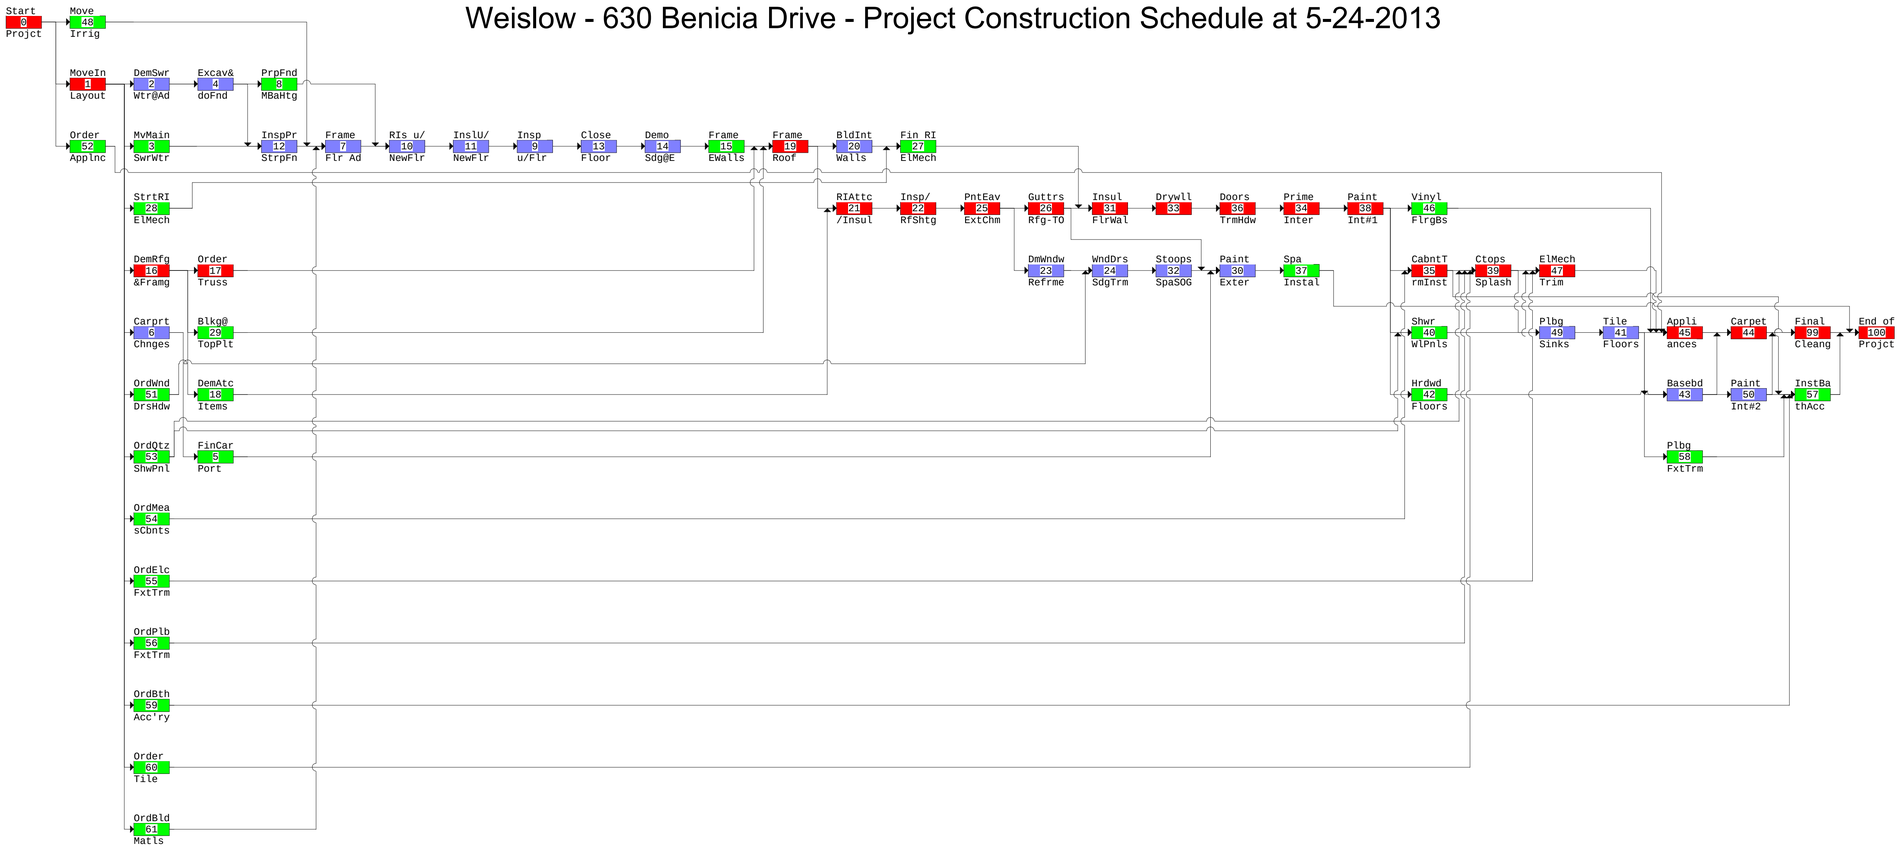

Activities List - for items listed at left on Diagram above

Num	Description	Start-Early-Finish	Start-Late-Finish	Slack	Free Days	Delay	Cost	Labor	Units	Num
0	Start Projct	06-03-13 06-03-13	06-03-13 06-03-13	0	0	0	0	0	0	0
48	Move Irrig	06-03-13 06-04-13	06-14-13 06-17-13	9	7	2	0	0	0	48
1	MoveIn Layout	06-03-13 06-03-13	06-03-13 06-03-13	0	0	1	0	0	0	1
52	Order Applnc	06-03-13 06-28-13	09-19-13 10-16-13	76	76	20	0	0	0	52
3	MvMainSwrWtr	06-04-13 06-04-13	06-13-13 06-13-13	7	5	1	0	0	0	3
28	StrtRIElMech	06-04-13 06-04-13	08-01-13 08-01-13	41	26	1	0	0	0	28
16	DemRfg&Framg	06-04-13 06-10-13	06-04-13 06-10-13	0	0	5	0	0	0	16
6	CarprtChnges	06-04-13 06-05-13	10-03-13 10-04-13	85	0	2	0	0	0	6
51	OrdWndDrsHdw	06-04-13 07-09-13	08-22-13 09-26-13	56	21	25	0	0	0	51
2	DemSwrWtr@Addtn	06-04-13 06-04-13	06-06-13 06-06-13	2	0	1	0	0	0	2
53	OrdQtzShwPnl	06-04-13 07-01-13	08-30-13 09-27-13	62	56	20	0	0	0	53
54	OrdMeasCbnts	06-04-13 07-16-13	08-08-13 09-19-13	46	46	30	0	0	0	54
55	OrdElcFxtTrm	06-04-13 07-01-13	09-10-13 10-07-13	68	68	20	0	0	0	55
56	OrdPlbFxtTrm	06-04-13 07-16-13	08-16-13 09-27-13	52	52	30	0	0	0	56
59	OrdBthAcc'ry	06-04-13 06-24-13	10-02-13 10-22-13	84	81	15	0	0	0	59
60	Order Tile	06-04-13 06-24-13	09-09-13 09-27-13	67	67	15	0	0	0	60
61	OrdBldMatls	06-04-13 06-10-13	06-11-13 06-17-13	5	3	5	0	0	0	61
4	Excav&doFnd	06-05-13 06-11-13	06-07-13 06-13-13	2	0	5	0	0	0	4
5	FinCarPort	06-06-13 06-10-13	10-07-13 10-09-13	85	50	3	0	0	0	5
17	Order Truss	06-11-13 07-01-13	06-11-13 07-01-13	0	0	15	0	0	0	17
29	Blkg@ TopPlt	06-11-13 06-12-13	06-28-13 07-01-13	13	13	2	0	0	0	29
18	DemAtcItems	06-11-13 06-14-13	07-02-13 07-08-13	15	15	4	0	0	0	18
8	PrpFndMBaHtg	06-12-13 06-13-13	06-18-13 06-19-13	4	2	2	0	0	0	8
12	InspPrStrpFnd	06-12-13 06-13-13	06-14-13 06-17-13	2	0	2	0	0	0	12
7	Frame Flr Addtn	06-14-13 06-17-13	06-18-13 06-19-13	2	0	2	0	0	0	7
10	RIs u/NewFlr	06-18-13 06-19-13	06-20-13 06-21-13	2	0	2	0	0	0	10
11	InslU/NewFlr	06-20-13 06-20-13	06-24-13 06-24-13	2	0	1	0	0	0	11
9	Insp u/Flr	06-21-13 06-21-13	06-25-13 06-25-13	2	0	1	0	0	0	9
13	Close Floor	06-24-13 06-24-13	06-26-13 06-26-13	2	0	1	0	0	0	13
14	Demo Sdg@E	06-25-13 06-25-13	06-27-13 06-27-13	2	0	1	0	0	0	14
15	Frame EWalls	06-26-13 06-27-13	06-28-13 07-01-13	2	2	2	0	0	0	15
19	Frame Roof	07-02-13 07-08-13	07-02-13 07-08-13	0	0	4	0	0	0	19

Num	Description	Start-Early-Finish	Start-Late-Finish	Slack	Free Days	Delay	Cost	Labor	Units	Num
21	RIAttc/Insul	07-09-13 07-22-13	07-09-13 07-22-13	0	0	10	0	0	0	21
20	BldIntWalls	07-09-13 07-11-13	07-30-13 08-01-13	15	0	3	0	0	0	20
27	Fin RI ElMech	07-12-13 07-22-13	08-02-13 08-12-13	15	15	7	0	0	0	27
22	Insp/ RfShtg	07-23-13 07-26-13	07-23-13 07-26-13	0	0	4	0	0	0	22
25	PntEavExtChmm	07-29-13 08-01-13	07-29-13 08-01-13	0	0	4	0	0	0	25
26	GuttrsRfg-TO	08-02-13 08-12-13	08-02-13 08-12-13	0	0	7	0	0	0	26
23	DmWndwRefrme	08-02-13 08-07-13	09-23-13 09-26-13	35	0	4	0	0	0	23
24	WndDrsSdgTrm	08-08-13 08-15-13	09-27-13 10-04-13	35	0	6	0	0	0	24
31	Insul FlrWalls	08-13-13 08-13-13	08-13-13 08-13-13	0	0	1	0	0	0	31
33	Drywll	08-14-13 08-29-13	08-14-13 08-29-13	0	0	12	0	0	0	33
32	StoopsSpaSOG	08-16-13 08-20-13	10-07-13 10-09-13	35	0	3	0	0	0	32
30	Paint Exter	08-21-13 09-04-13	10-10-13 10-23-13	35	0	10	0	0	0	30
36	Doors TrmHdw	08-30-13 09-05-13	08-30-13 09-05-13	0	0	4	0	0	0	36
37	Spa Instal	09-05-13 09-05-13	10-24-13 10-24-13	35	35	1	0	0	0	37
34	Prime Inter	09-06-13 09-12-13	09-06-13 09-12-13	0	0	5	0	0	0	34
38	Paint Int#1	09-13-13 09-19-13	09-13-13 09-19-13	0	0	5	0	0	0	38
35	CabntTrmInstall	09-20-13 09-27-13	09-20-13 09-27-13	0	0	6	0	0	0	35
40	Shwr WlPnls	09-20-13 09-20-13	10-07-13 10-07-13	11	11	1	0	0	0	40
42	Hrdwd Floors	09-20-13 09-25-13	10-11-13 10-16-13	15	14	4	0	0	0	42
46	Vinyl FlrgBs	09-20-13 09-20-13	10-16-13 10-16-13	18	18	1	0	0	0	46
39	Ctops Splash	09-30-13 10-07-13	09-30-13 10-07-13	0	0	6	0	0	0	39
49	Plbg Sinks	10-08-13 10-08-13	10-09-13 10-09-13	1	0	1	0	0	0	49
47	ElMechTrim	10-08-13 10-16-13	10-08-13 10-16-13	0	0	7	0	0	0	47
41	Tile Floors	10-09-13 10-15-13	10-10-13 10-16-13	1	0	5	0	0	0	41
58	Plbg FxtTrm	10-16-13 10-17-13	10-21-13 10-22-13	3	0	2	0	0	0	58
43	Basebd	10-16-13 10-16-13	10-17-13 10-17-13	1	0	1	0	0	0	43
45	Appli ances	10-17-13 10-21-13	10-17-13 10-21-13	0	0	3	0	0	0	45
50	Paint Int#2	10-17-13 10-22-13	10-18-13 10-23-13	1	1	4	0	0	0	50
57	InstBathAcc	10-18-13 10-18-13	10-23-13 10-23-13	3	3	1	0	0	0	57
44	Carpet	10-22-13 10-23-13	10-22-13 10-23-13	0	0	2	0	0	0	44
99	Final Cleang	10-24-13 10-24-13	10-24-13 10-24-13	0	0	1	0	0	0	99
100	End of Projct	10-24-13 10-24-13	10-24-13 10-24-13	0	0	0	0	0	0	100
